



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Ordem do dia

Ponto n.º 03

Ata n.º 13

2020.07.16

RECUPERAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA EM 564 – (AIRÃES – VILA VERDE) – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – Presente a

informação prestada pelo Técnico, Eng.º Jorge Almeida, que obteve concordância do Chefe da Divisão Eng.º Luís Barros, em anexo. -----

O Senhor Vice-Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. À reunião de Câmara para ratificação."-----

Deliberação – A Câmara Municipal delibera ratificar o despacho. Esta deliberação foi tomada por cinco votos a favor e quatro votos contra dos Senhores Vereadores João Sousa, Carla Meireles, Joaquim Ribeiro e Rui Pedro Lopes. -----





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Parecer

Propõe-se a aprovação nos termos da informação da prorrogação de prazo a título gracioso.

O Chefe da DO

Luís Barros

07/07/2020

Despacho

*concedido. à Nuno
de acordo com Barros.*

O Vice Presidente da Câmara,
Por Impedimento do Senhor Presidente

O Vice-Presidente da Câmara

Dr. Fernando Fernandes

7/7/2020

PROCESSO / EMPREITADA	300-17-RECUPERAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EM 564 –(AIRÃES – VILA VERDE)
ADJUDICATÁRIO	MJFT Construções Unipessoal, Lda.
DATA	07/07/2020
ASSUNTO	Pedido prorrogação de prazo

Exm^o. Sr. Presidente
Nuno Fonseca

Vem o empreiteiro através de requerimento com registo de entrada 2874, Proc. 11716/20 datada de 18.06.2020, solicitando a prorrogação de prazo por mais 180 dias, invocando como razão válida para os atrasos verificados na dificuldade de libertação dos terrenos correspondentes aos diferentes parcelários assim como a atual pandemia Covid19 e juntando novo plano de trabalhos ajustado às obras que falta executar. Importa referir que a obra já foi abrangida por uma prorrogação de prazo de 180 dias, a qual terminou a 5 de maio do corrente ano, razão pela qual foi apresentado o presente pedido de prorrogação pelo empreiteiro.

Tendo em consideração as razões invocadas e ao estado de execução da obra, sou da opinião que deve ser autorizada a respetiva prorrogação solicitada, pelo prazo de 180 dias.

(Jorge Almeida)
(Eng. Civil)

Jorge Silva Pinto Almeida





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
GABINETE DO MUNICÍPE

18 JUN. 2020

REG. 274 PROC. 11/2020

O(a) atendedor(a) *[Signature]*

PARA:

Câmara Municipal de Felgueiras
Praça da República - Margaride

4610-116 - Felgueiras

V/ Referência:

N/ Referência.: ADMIN_034/2020 R/Car

Data: 2020/05/2

Assunto: EMPREITADA: "Recuperação/Beneficiação da EM 564 Airões - Vila Verde"

Exm^o. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras,

Vimos por este meio formalizar o pedido de prorrogação do prazo da empreitada em epígrafe por 180 dias.

Tendo como justificação o atraso na libertação dos terrenos dos parcelários na presente data, ainda não estão todos disponíveis estando a ser negociados com os proprietários e falta definições dos trabalhos a realizar nas parcelas.

A pandemia causada pelo virus do Covid está ainda a condicionar o normal desenvolvimento dos trabalhos .


Gratos pela atenção dispensada apresentamos desde já os nossos melhores cumprimentos,

Niguel José António Lourenço



PLANO DE TRABALHOS


EMPRESA: "Recuperação da EMBRA (Aéreas_Vila Verde)"

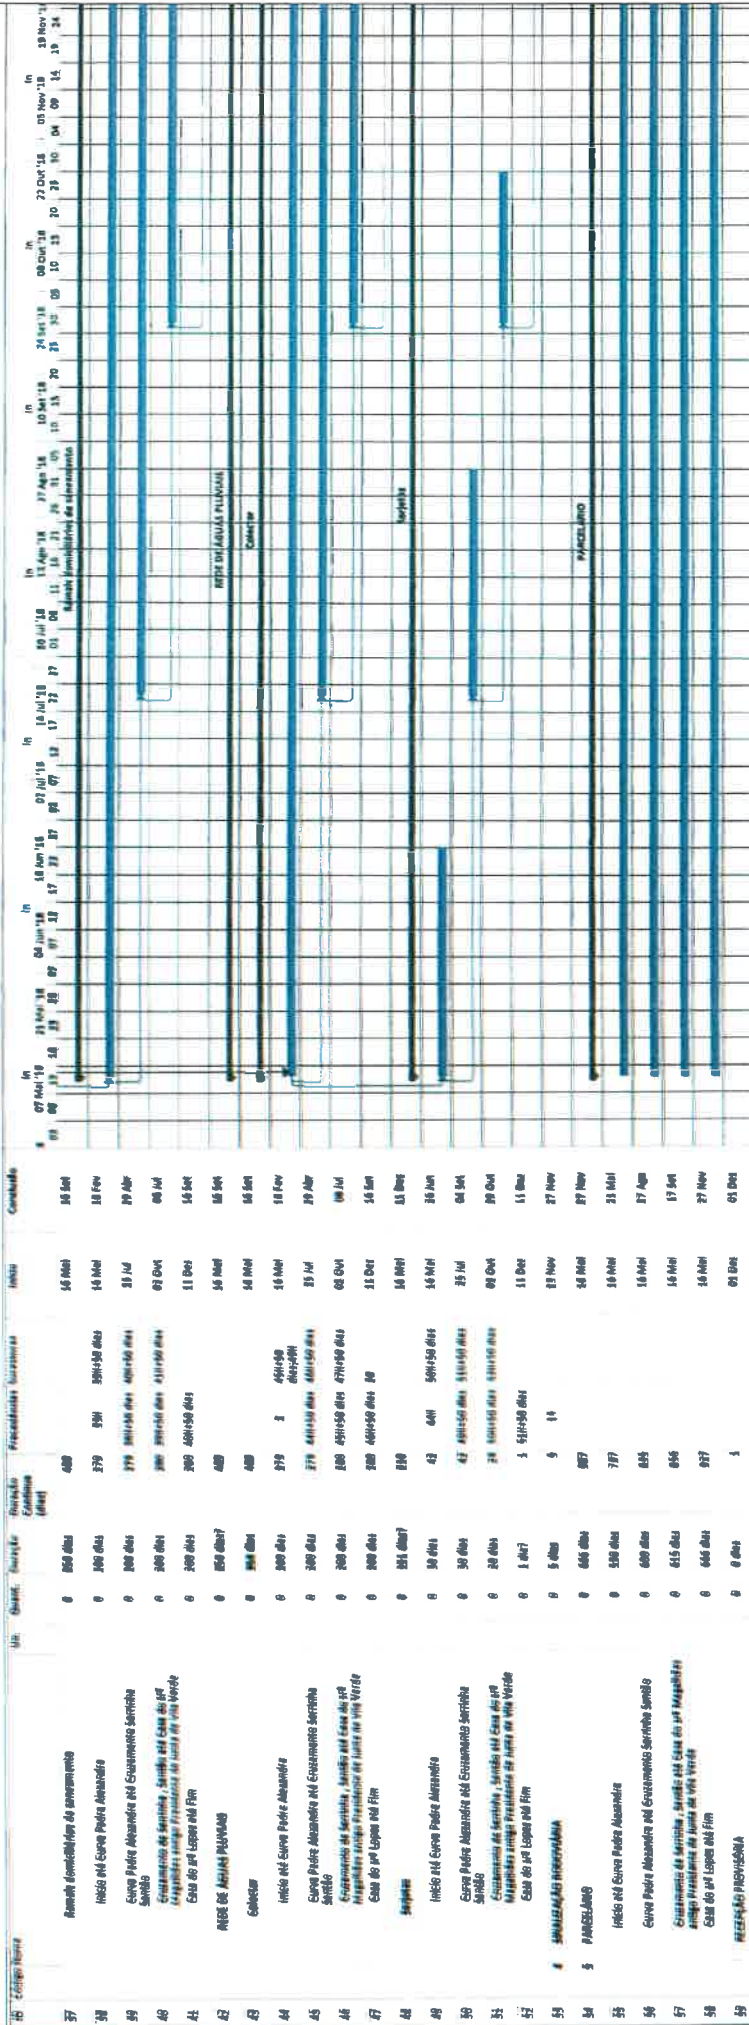



PLANO DE TRABALHOS


EMPRESA: "Recuperação da EMISA (Áreas_Vila Verde)"

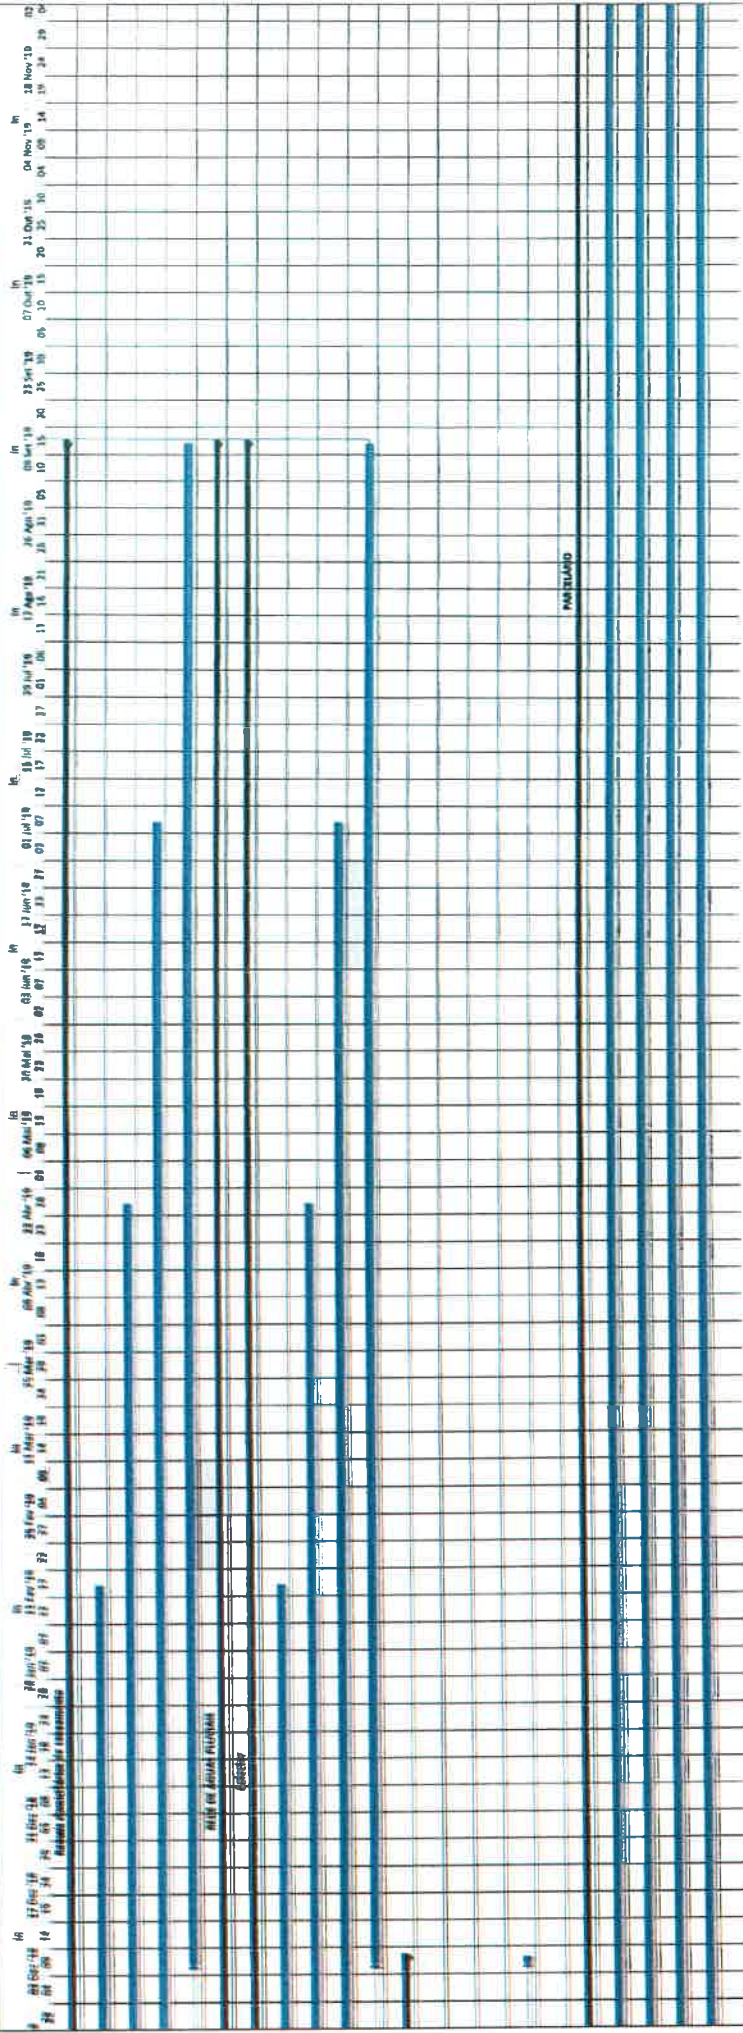



PLANO DE TRABALHOS

EMPRESA: "Recuperação da EM64 (Aguas, Vila Verde)"

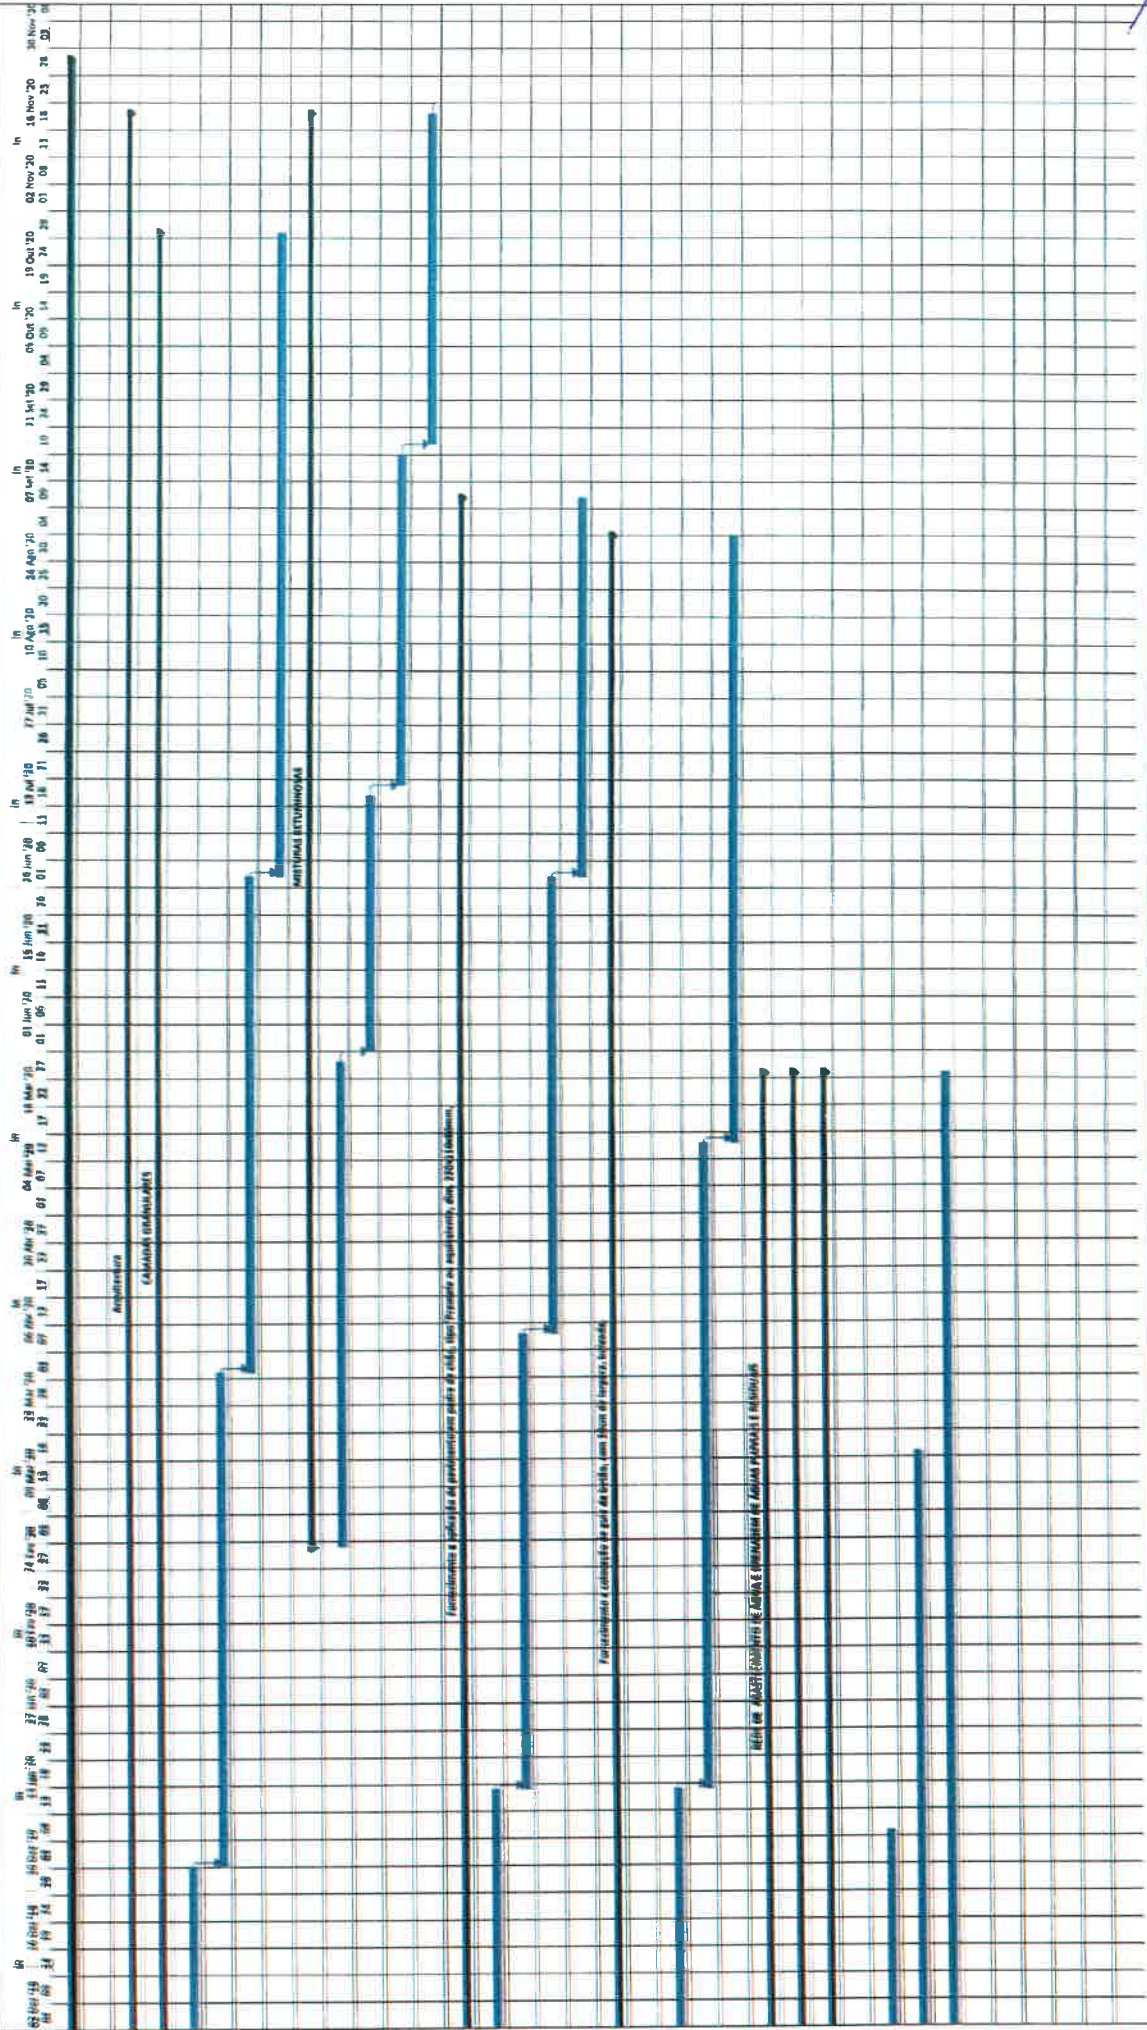


Legenda:

- Tarefa Crítica
- Tarefa
- Tarefa
- Tarefa
- Tarefa para Recuperação
- Compartilhamento Previsível
- Mais Tarefa
- Mais Tarefa
- Tarefa Manual
- Agendamento
- Resumo de Agrupamento Manual
- Resumo Manual
- Agenda Vista
- Apresentação
- Tarefa Estima
- Mais Estima

Página 1 / 6

PLANO DE TRABALHOS

EMPRESITA: "Recuperação de BMS04 (Aéreo_Vila Verde)"

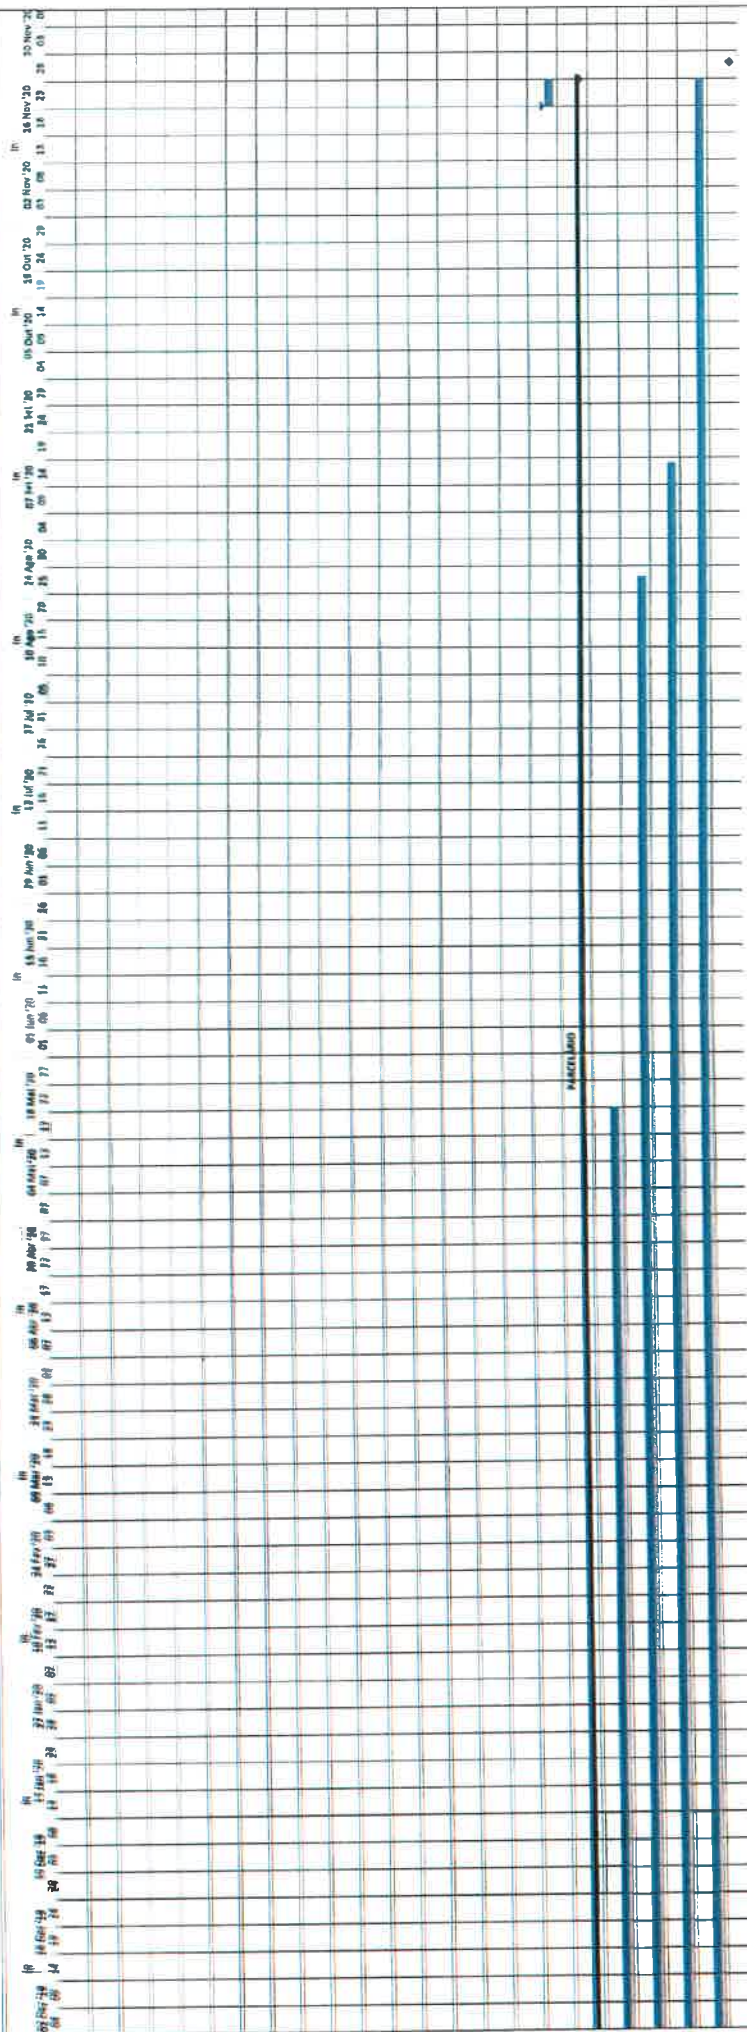


Tarefa 01 Tarefa 02 Tarefa 03 Tarefa 04 Tarefa 05	Tarefa 06 Tarefa 07 Tarefa 08 Tarefa 09 Tarefa 10 Tarefa 11	Tarefa 12 Tarefa 13 Tarefa 14 Tarefa 15 Tarefa 16 Tarefa 17 Tarefa 18 Tarefa 19 Tarefa 20 Tarefa 21 Tarefa 22 Tarefa 23 Tarefa 24 Tarefa 25 Tarefa 26 Tarefa 27 Tarefa 28 Tarefa 29 Tarefa 30 Tarefa 31 Tarefa 32 Tarefa 33 Tarefa 34 Tarefa 35 Tarefa 36 Tarefa 37 Tarefa 38 Tarefa 39 Tarefa 40 Tarefa 41 Tarefa 42 Tarefa 43 Tarefa 44 Tarefa 45 Tarefa 46 Tarefa 47 Tarefa 48 Tarefa 49 Tarefa 50	Tarefa 51 Tarefa 52 Tarefa 53 Tarefa 54 Tarefa 55 Tarefa 56 Tarefa 57 Tarefa 58 Tarefa 59 Tarefa 60 Tarefa 61 Tarefa 62 Tarefa 63 Tarefa 64 Tarefa 65 Tarefa 66 Tarefa 67 Tarefa 68 Tarefa 69 Tarefa 70 Tarefa 71 Tarefa 72 Tarefa 73 Tarefa 74 Tarefa 75 Tarefa 76 Tarefa 77 Tarefa 78 Tarefa 79 Tarefa 80 Tarefa 81 Tarefa 82 Tarefa 83 Tarefa 84 Tarefa 85 Tarefa 86 Tarefa 87 Tarefa 88 Tarefa 89 Tarefa 90 Tarefa 91 Tarefa 92 Tarefa 93 Tarefa 94 Tarefa 95 Tarefa 96 Tarefa 97 Tarefa 98 Tarefa 99 Tarefa 100	Tarefa 101 Tarefa 102 Tarefa 103 Tarefa 104 Tarefa 105 Tarefa 106 Tarefa 107 Tarefa 108 Tarefa 109 Tarefa 110 Tarefa 111 Tarefa 112 Tarefa 113 Tarefa 114 Tarefa 115 Tarefa 116 Tarefa 117 Tarefa 118 Tarefa 119 Tarefa 120 Tarefa 121 Tarefa 122 Tarefa 123 Tarefa 124 Tarefa 125 Tarefa 126 Tarefa 127 Tarefa 128 Tarefa 129 Tarefa 130 Tarefa 131 Tarefa 132 Tarefa 133 Tarefa 134 Tarefa 135 Tarefa 136 Tarefa 137 Tarefa 138 Tarefa 139 Tarefa 140 Tarefa 141 Tarefa 142 Tarefa 143 Tarefa 144 Tarefa 145 Tarefa 146 Tarefa 147 Tarefa 148 Tarefa 149 Tarefa 150
---	--	---	---	--

Handwritten signature and blue arrow in the top right corner.

Página 6 / 6



~~Handwritten scribble or signature~~

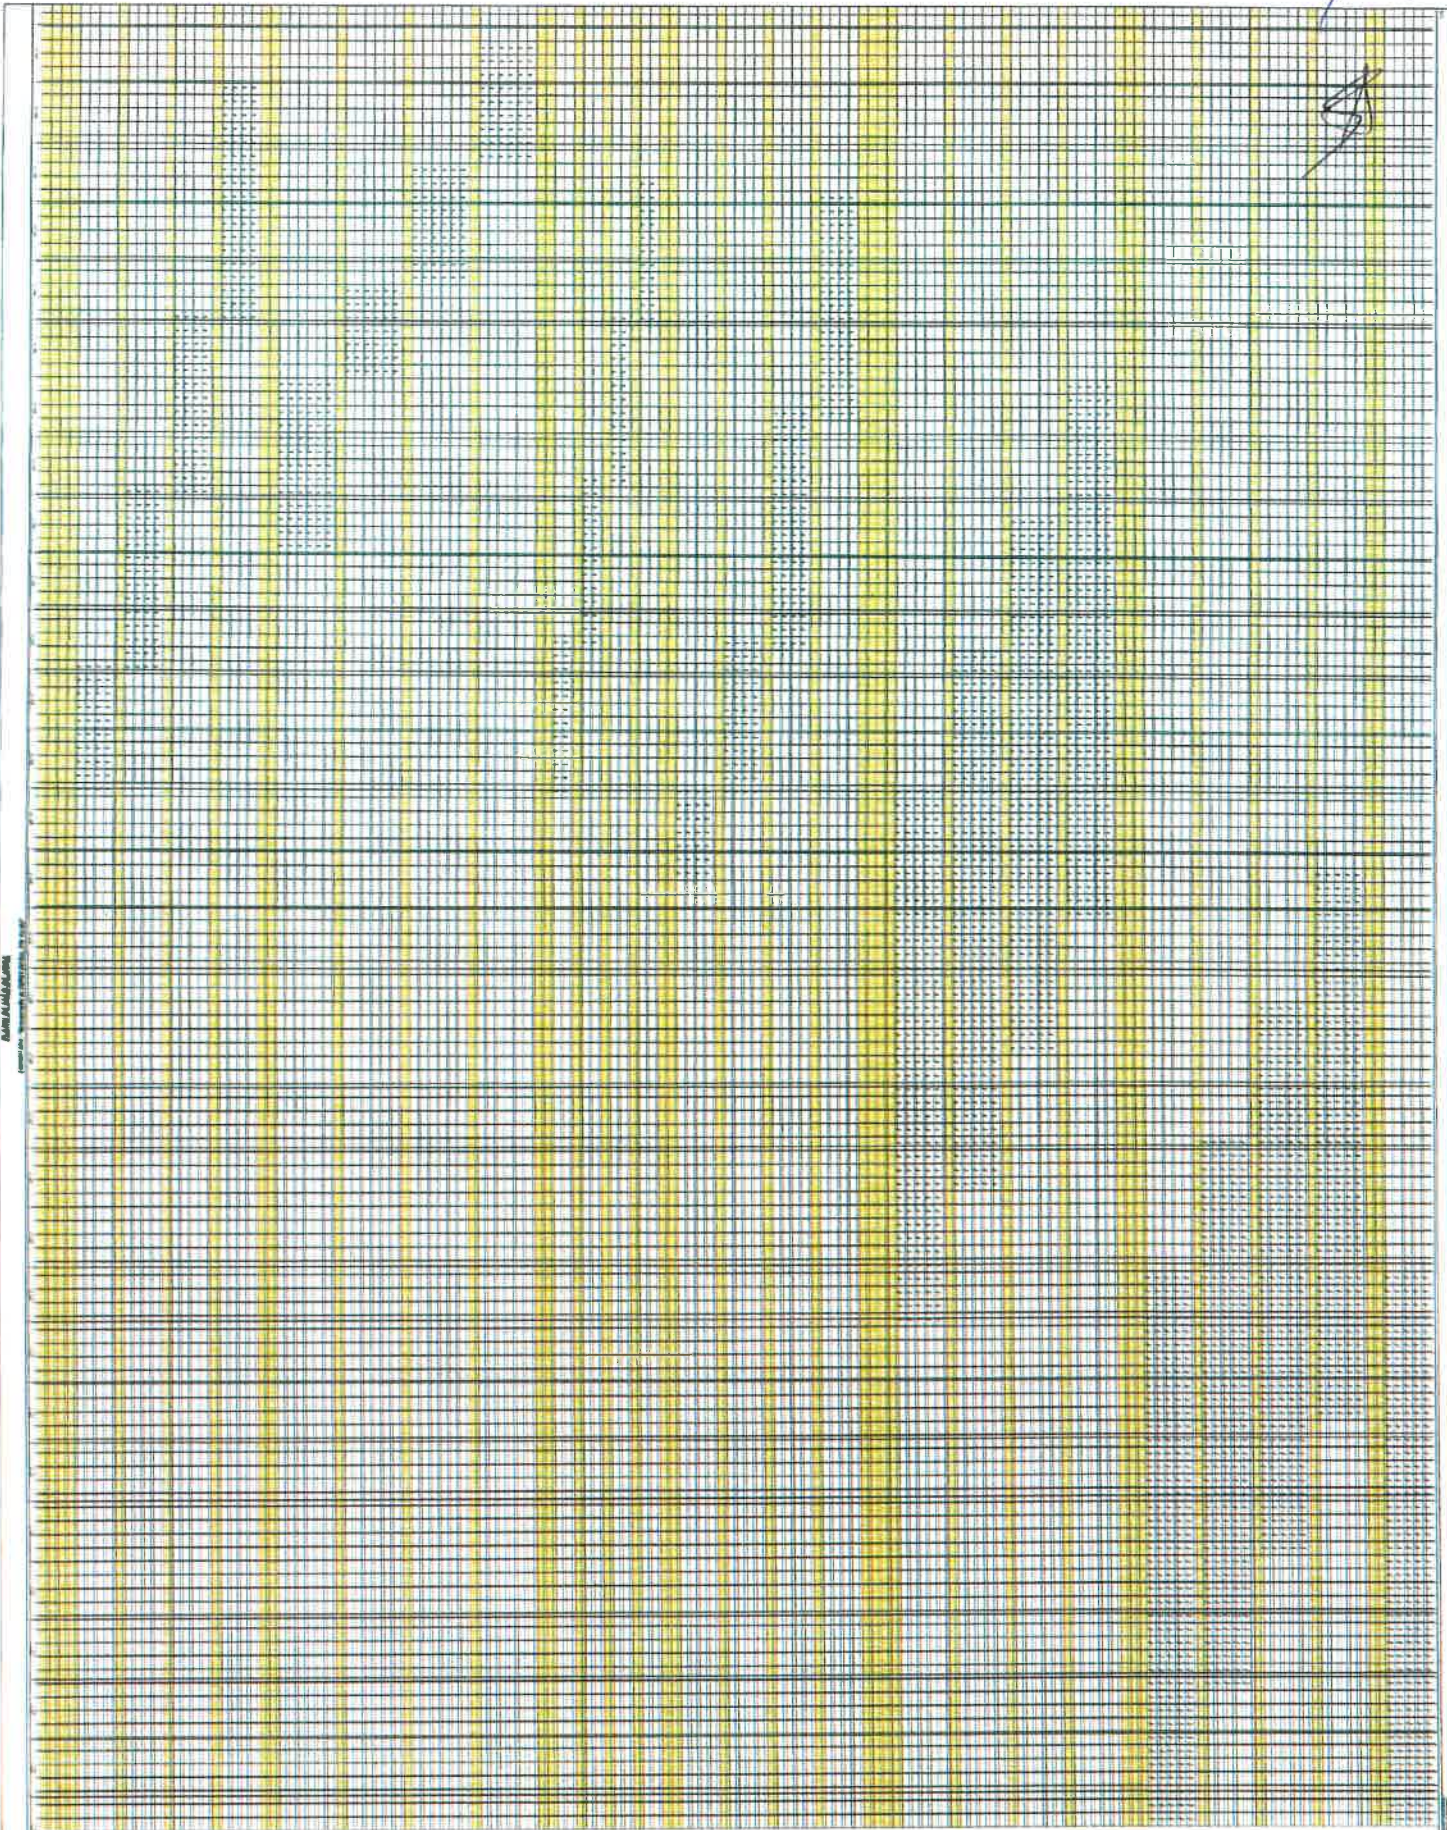

Small vertical text on the left margin, possibly a page number or reference code.

Handwritten notes and data at the bottom of the page, organized into several columns. The text is dense and appears to be a list or a set of calculations. Some words are highlighted in red, and there are some larger, bolded words. The notes are written in black ink on a white background.

M.

Table with multiple columns and rows, containing data points. The table is mostly empty, with some faint text visible in the left margin.



Handwritten mark resembling a stylized '4' or a signature.

~~Handwritten scribble or mark.~~

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1970-01-01
1970-01-05
1970-01-10
1970-01-15
1970-01-20
1970-01-25
1970-02-01
1970-02-05
1970-02-10
1970-02-15
1970-02-20
1970-02-25
1970-03-01
1970-03-05
1970-03-10
1970-03-15
1970-03-20
1970-03-25
1970-04-01
1970-04-05
1970-04-10
1970-04-15
1970-04-20
1970-04-25
1970-05-01
1970-05-05
1970-05-10
1970-05-15
1970-05-20
1970-05-25
1970-06-01
1970-06-05
1970-06-10
1970-06-15
1970-06-20
1970-06-25
1970-07-01
1970-07-05
1970-07-10
1970-07-15
1970-07-20
1970-07-25
1970-08-01
1970-08-05
1970-08-10
1970-08-15
1970-08-20
1970-08-25
1970-09-01
1970-09-05
1970-09-10
1970-09-15
1970-09-20
1970-09-25
1970-10-01
1970-10-05
1970-10-10
1970-10-15
1970-10-20
1970-10-25
1970-11-01
1970-11-05
1970-11-10
1970-11-15
1970-11-20
1970-11-25
1970-12-01
1970-12-05
1970-12-10
1970-12-15
1970-12-20
1970-12-25
1970-12-31

Handwritten initials or signature in the top right corner.

